



ICM Italia General Contractor Srl

WALTHERPARK - KAUFHAUS BOZEN

UVS – SIA

**Anlage - Allegato A006:
Bautransporte (Zeiten und Wege)
Transporti (tempi e percorsi)**

Antragsteller:
Richiedente: **KHB
GmbH**

Projektanten:
Progettisti:



ICM Italia General Contractor SRL

in.ge.na.

Ingenieurwesen • Geologie • Naturlandschaftsplanung
Ingegneria • Geologia • Natura e Pianificazione

DMA

DMA Italia SRL




Datum/ Data: 16.03.2018

Rev.01

WALTERPARK - KAUFHAUS BOZEN

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger	Anfang	Fertig stellen	MENGE
1	GESAMTTERMINPLAN AUSFÜHRUNGSTERMINE	801 Tage		Mo 18.12.18	Mo 09.05.22	
2	WALTERPARK	801 Tage		Mo 18.12.18	Mo 09.05.22	
3	ABBRÜCHE	158 Tage		Mo 18.12.18	Mo 17.07.19	
4	ABBRUCH EHEM. HOTEL ALPI	71 Tage		Mo 18.12.18	Mo 18.03.19	19.000,00 m³
5	ABBRUCH ALTER BUSBAHNHOF UND PERATHONERGARAGE	111 Tage		Mo 18.12.18	Mo 17.05.19	
6	ABBRUCH ALTE HANDELSKAMMER	60 Tage		Di 25.04.19	Mo 17.07.19	
7	BAUGRUBE	227 Tage		Di 19.03.19	Mo 29.01.20	
8	WESTHALFTE / SÜDTROLERSTRASSE	140 Tage		Di 19.03.19	Mo 30.09.19	
9	OSTHALFTE / PARK	140 Tage		Di 19.03.19	Mo 25.01.20	
10	HAUPTSTRUKTUR	601 Tage		Di 01.10.19	Mo 09.05.22	9.200,00 m³
11	ROHBAU WEST UNTERERDICH	140 Tage		Di 01.10.19	Mo 13.04.20	9.200,00 m³
12	5. UNTERGESCHOSS	35 Tage	8	Di 01.10.19	Mo 18.11.19	
13	4. UNTERGESCHOSS	45 Tage	12EA-15 Tage	Di 28.10.19	Mo 26.12.19	
14	3. UNTERGESCHOSS	45 Tage	13EA-15 Tage	Di 10.12.19	Mo 10.02.20	
15	2. UNTERGESCHOSS	35 Tage	14EA-15 Tage	Di 21.01.20	Mo 09.03.20	
16	1. UNTERGESCHOSS	40 Tage	15EA-15 Tage	Di 18.02.20	Mo 13.04.20	
17	ROHBAU WEST OBERGESCHOSS	107 Tage		Di 14.04.20	Mo 28.08.20	
18	ERDGESCHOSS	30 Tage	16EA-15 Tage	Di 14.04.20	Mo 25.05.20	
19	1. OBERGESCHOSS	30 Tage	18EA-15 Tage	Di 05.05.20	Mo 15.06.20	
20	2. OBERGESCHOSS	30 Tage	19EA-15 Tage	Di 26.05.20	Mo 06.07.20	
21	HOTELGEBÄUDE 3.-7. OBERGESCHOSS	60 Tage	20	Di 07.07.20	Mo 28.09.20	1.650,00 m³
22	GEBÄUDE 1.-3.-5. OBERGESCHOSS	50 Tage	20	Di 07.07.20	Mo 14.09.20	500,00 m³
23	GEBÄUDE 1.-3.-4. OBERGESCHOSS	40 Tage	20	Di 07.07.20	Mo 31.08.20	470,00 m³
24	GEBÄUDE 1.-3.-4. OBERGESCHOSS	55 Tage	20	Di 07.07.20	Mo 21.09.20	
25	ROHBAU OST UNTERERDICH	167 Tage		Di 28.08.20	Mo 12.08.20	8.000,00 m³
26	5. UNTERGESCHOSS	35 Tage	9	Di 30.01.20	Mo 18.03.20	
27	4. UNTERGESCHOSS	45 Tage	20EA-15 Tage	Di 07.02.20	Mo 29.04.20	
28	3. UNTERGESCHOSS	45 Tage	27EA-15 Tage	Di 09.04.20	Mo 08.06.20	
29	2. UNTERGESCHOSS	35 Tage	28EA-15 Tage	Di 21.05.20	Mo 08.07.20	
30	1. UNTERGESCHOSS	40 Tage	29EA-15 Tage	Di 18.06.20	Mo 12.08.20	
31	ROHBAU OST OBERGESCHOSS	120 Tage		Di 18.08.20	Mo 21.01.21	8.000,00 m³
32	ERDGESCHOSS	30 Tage	30	Di 18.08.20	Mo 23.09.20	
33	1. OBERGESCHOSS	30 Tage	32EA-15 Tage	Di 03.09.20	Mo 14.10.20	
34	2. OBERGESCHOSS	30 Tage	33EA-15 Tage	Di 24.09.20	Mo 04.11.20	
35	GEBÄUDE III - 6. OBERGESCHOSS	60 Tage	34	Di 05.11.20	Mo 27.01.21	540,00 m³
36	GEBÄUDE IV - 3.-6. OBERGESCHOSS	60 Tage	34	Di 05.11.20	Mo 27.01.21	1.100,00 m³
37	GEBÄUDE V - 3.-6. OBERGESCHOSS	60 Tage	34	Di 05.11.20	Mo 27.01.21	620,00 m³
38	GEBÄUDE VI - 3.-6. OBERGESCHOSS	60 Tage	34	Di 05.11.20	Mo 27.01.21	480,00 m³
39	GEBÄUDE HÜLLE / FASSADE	200 Tage	21	Di 28.09.20	Mo 05.01.21	1.000 psch
40	AUSBAUARBEITEN	400 Tage		Di 07.07.20	Mo 17.01.21	1,00 psch
41	INSTALLATIONEN TECHNIK 5. UNTERGESCHOSS - 2 OBERGESCHOSS	100 Tage		Di 07.07.20	Mo 23.11.20	1,00 psch
42	AUSBAUARBEITEN UNTERGESCHOSS - 2 OBERGESCHOSS	60 Tage	41	Di 24.11.20	Mo 15.02.21	1,00 psch
43	HOTELGEBÄUDE	300 Tage	21EA-20 Tage	Di 01.09.20	Mo 17.01.21	1,00 psch
44	GEBÄUDE I	200 Tage	22EA-20 Tage	Di 18.09.20	Mo 24.05.21	1,00 psch
45	GEBÄUDE II	200 Tage	23EA-20 Tage	Di 04.10.20	Mo 10.05.21	1,00 psch
46	GEBÄUDE III	200 Tage	30EA-20 Tage	Di 31.12.20	Mo 06.10.21	1,00 psch
47	GEBÄUDE IV	200 Tage	36EA-20 Tage	Di 31.12.20	Mo 06.10.21	1,00 psch
48	GEBÄUDE V	200 Tage	37EA-20 Tage	Di 31.12.20	Mo 06.10.21	1,00 psch
49	GEBÄUDE VI	200 Tage	38EA-20 Tage	Di 31.12.20	Mo 06.10.21	1,00 psch
50	GEBÄUDE VII	200 Tage	24EA-20 Tage	Di 25.02.20	Mo 21.05.21	1,00 psch
51	MIETRAUSBAU	120 Tage		Di 23.11.21	Mo 09.05.22	
52	FERTIGSTELLUNG/KOMPLETTIERUNG WOHNEN UND HOTEL	80 Tage		Di 18.01.22	Mo 09.05.22	
53	GESAMTFERTIGSTELLUNG/ERÖFFNUNG	0 Tage	52	Mo 09.05.22	Mo 09.05.22	
54	INFRASTRUKTUR	1451 Tage		Mo 11.12.17	Mo 28.12.21	
55	BUSBAHNHOF	222 Tage		Mo 11.12.17	Di 16.10.18	
56	ABBRUCHARBEITEN HAUPTBAHNHOF	50 Tage		Mo 11.12.17	Fr 16.02.18	
57	NEUER BUSBAHNHOF 2b-3b UND RITTNERSTRASSE 20.21.22 UND 23	81 Tage		Mo 29.06.18	Mo 15.10.18	
58	INSTRUMENTIERUNG NEUER BUSBAHNHOF	1 Tag	57	Di 16.10.18	Di 16.10.18	
59	TUNNEL	685 Tage		Di 23.08.18	Mo 21.04.21	
60	GAS UND KANALUMLEGUNG (SCHWARZWASSER) 11a	83 Tage		Di 23.08.18	Mo 17.12.18	
61	TUNNEL VERDRIPLATZ 3a-12	80 Tage		Di 30.01.19	Di 27.05.19	
62	MASCHINENRAUM/CONTRACTOR ZENTRALE 1a (n)	60 Tage		Mo 24.04.19	Di 16.07.19	
63	TUNNELPORTAL 1b	60 Tage	62	Mo 22.05.19	Di 13.08.19	
64	PROV. RAMPE WALTERPLATZ 1b	60 Tage	61	Mo 17.07.19	Di 08.10.19	
65	TUNNEL PHASE 2a	60 Tage		Mo 17.07.19	Di 08.10.19	
66	TUNNEL 3a-3b	70 Tage	65	Mo 09.10.19	Di 24.03.20	
67	TUNNEL 4a-5a	80 Tage		Mo 26.02.20	Di 16.06.20	
68	TUNNEL 5b-6	80 Tage	67	Mo 17.08.20	Di 06.10.20	
69	TUNNEL 7	100 Tage		Mo 09.09.20	Di 09.01.21	
70	CONTRACTOR ZENTRALE AUSSTATTEN UND KOMPLETIEREN 8f	100 Tage		Mo 15.07.20	Di 29.12.20	
71	TUNNELAUSBAUARBEITEN 8c	160 Tage		Mo 15.07.20	Di 23.02.21	
72	FERTIGSTELLUNG UND ABNAHME	40 Tage	69	Mo 27.01.21	Di 23.02.21	
73	INSTRUMENTIERUNG TUNNEL	20 Tage		Di 29.03.21	Mo 21.04.21	
74	STRASSEN / OBERFLÄCHEN	474 Tage		Mo 26.02.20	Mo 20.12.21	
75	MAYRNUSSERSTRASSE (GEHRADEWEI) 10a	40 Tage		Mo 26.02.20	Di 21.04.20	
76	MAYRNUSSERSTRASSE (GEHRADEWEI) 10f	60 Tage	76	Mo 22.04.20	Di 14.07.20	
77	MAYRNUSSERSTRASSE (GEHRADEWEI) 9a	40 Tage	76	Mo 15.07.20	Di 08.09.20	
78	MAYRNUSSERSTRASSE (GEHÄNGEUNTERFÜHRUNG UND GEHWEGBRÜCKE) 10d	80 Tage	77	Mo 09.09.20	Di 29.12.20	
79	MAYRNUSSERSTRASSE/VERDRIPLATZ (GEHÄNGEBRÜCKE) 11	60 Tage	78	Mo 30.12.20	Di 23.03.21	
80	LORETTI BRÜCKE / VERDRIPLATZ (GEHWEGBRÜCKE) 9b	60 Tage		Mo 17.06.20	Di 08.09.20	
81	VERDRIPLATZ 13a	40 Tage		Mo 14.07.21	Di 07.09.21	
82	SÜDTROLERSTRASSE 12a	40 Tage		Mo 27.01.21	Di 23.03.21	
83	SÜDTROLERSTRASSE 12b	40 Tage	82	Mo 24.03.21	Di 16.05.21	
84	SÜDTROLERSTRASSE/WALD THERAPIE 13b	40 Tage	81	Mo 08.09.21	Di 03.11.21	
85	WALTERPLATZ PARK (VORHANDENE RAMPE) 15c	40 Tage	79	Mo 24.03.21	Di 18.05.21	
86	BAHNHOFPLATZ 18	40 Tage		Mo 16.08.21	Di 10.08.21	
87	BAHNHOFPLATZ 17	40 Tage		Mo 24.03.21	Di 18.05.21	
88	BAHNHOFPLATZ 16a	40 Tage		Mo 21.04.21	Di 15.06.21	
89	RITTNERSTRASSE 18b	40 Tage		Mo 21.04.21	Di 15.06.21	
90	RITTNERSTRASSE 19	40 Tage	89	Mo 16.08.21	Di 10.08.21	
91	GARIBALDISTRASSE 14	60 Tage	90	Mo 11.08.21	Di 03.11.21	
92	PARK 15a-15b	70 Tage		Di 06.07.21	Mo 20.12.21	

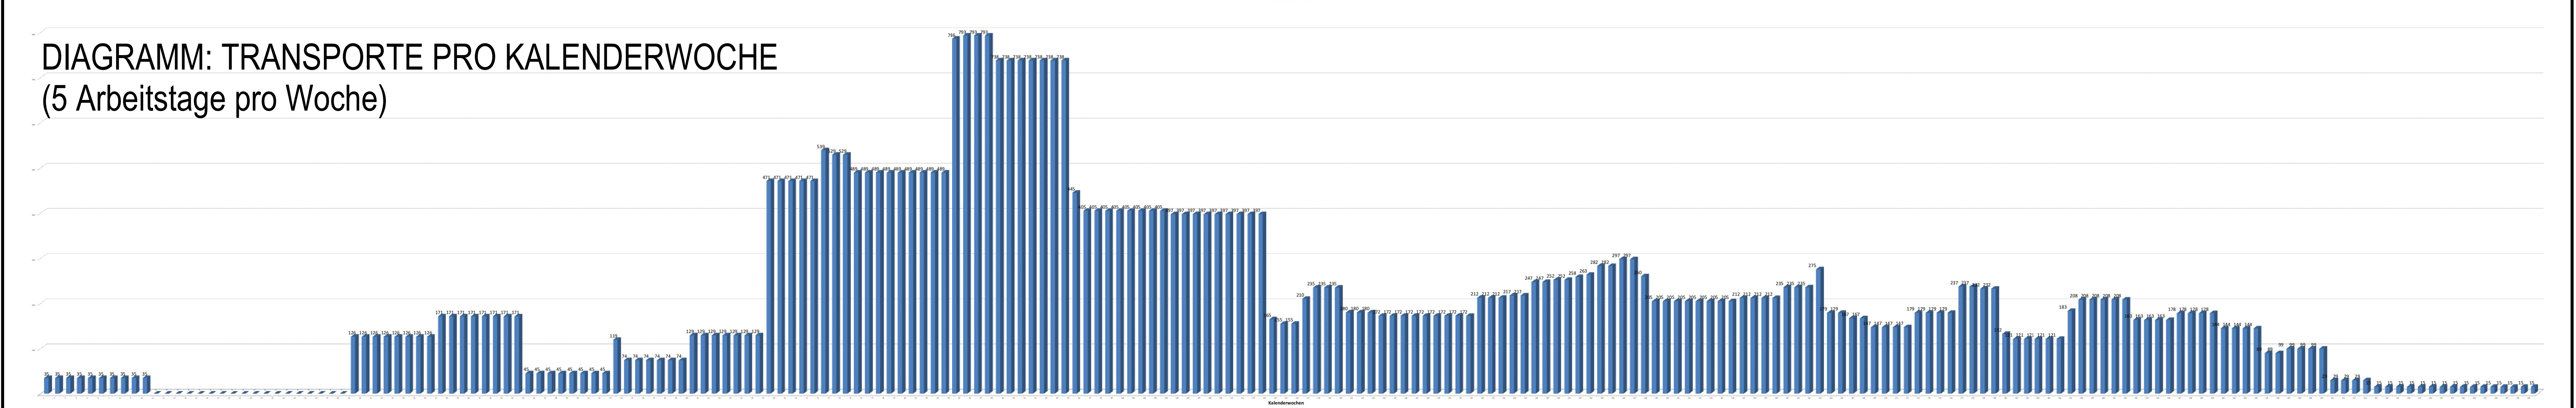

ansportweg SANTINI:
ährliches Material ca. 3.000,00 m³

Transportweg REMTEC:
- nicht gefährliches Material ca. 5.000,00 m³
- schwach verunreinigtes Material 92.000,00 m³

Transportweg BETONLANA:
- nicht verunreinigtes Material ca. 80.000,00 m³
- Lieferbeton ca. 110.000,00 m³

Transportweg MARX:
- nicht verunreinigtes Material ca. 55.000,00 m³

Transportweg ERDBAU:
- nicht verunreinigtes Material ca. 80.000,00 m³

Transportweg BAUSTOFFE:
